ООО «Климатическая Компания ВЕНТКОМПЛЕКС» г.Санкт-Петербург

(наименование ведомства, наладочной организации)

ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ **B-1**

Объект: Химическая лаборатория.
Зона (цех): Хроматографический зал, Аналитический зал
А. Общие сведения
1. Назначение системы: Местная вытяжка
2. Местонахождение оборудования системы: На капитальной стене во дворе здания.

Б. Основные технические характеристики оборудования системы

1. Вентилятор

Данные	Тип	№	Диаметр колеса D _{ном} , мм	Подача м ³ /ч	Полное давление Па	Диаметр шкива, мм	Частота вращения c ⁻¹
По проекту	BP 86-77	3,15	-				
Фактически	ВЦ 14-46	2,5	-	4492	1000		3000

Примечание: Радиальный вентилятор.

2. Электродвигатель

Данные	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения c ⁻¹	Диаметр шкива, мм	Вид передачи
По проекту	Асинхронный				Исп.1.(на валу)
Фактически	Асинхронный	3	3000		Исп.1.(на валу)

Примечание: 380 В.

3. Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные

			Схема			Опробование*
Данные	Тип или модель	Число	обвязки по теплохладоносителю	расположения по воздуху	Вид и параметры теплохладоносителя	теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено)
По проекту		-				
Фактически		-				

* Выполняется монтажной организацией с участием заказчика (наладочной организации).	
Примечание	

4. Пылегазоулавливающее устройство

Данные	Наименование	№	Число	Расход воздуха, м ³ /ч	% подсоса (выбив)	Сопротивление, Па
По проекту	-	-	-	-	-	=
Фактически	-	-	-	-	-	-

Примечание._____

5. Увлажнитель воздуха

Увлажнитель	не применяется по	Проекту.
Примечание.		

В. Расходы воздуха по помещениям (по сети)

Номер		Размер воздуховода	Расход воздуха, м ³ /ч		Невязка, %
мерного	Наименование помещений	(мерное сечение)	фактически	по проекту	отклонения от
сечения		MM	фактически	(нормам)	показателей
1	До вентилятора	ø315	4492		
2	Шкаф №1 795х450х1070	ø200	296		0
3	Хроматографический зал	ø200	499	388	+28
4	Вытяжной зонт 600х600	600x600	499	388	+28
5	Хроматографический зал	ø200	1470	388	+370
6	Вытяжной зонт 600х600	600x600	1624	388	+400
7	Шкаф №2 795х450х1070	ø200	215		
8	Аналитический зал	ø200	1356	486	+358
9	Вытяжной зонт 450х450	450x450	947	486	+200
10	Аналитический зал	ø200	550		
11	Аналитический зал	ø200	740		
	Большой вытяжной шкаф				
12	*Большой вытяжной шкаф	Рабочий просвет 1220x150	590	592	0
	1525x680x1240				
13	Аналитический зал	ø250	1832	776	+230

Схема системы вентиляции (кондиционирования воздуха)

Примечание: Прибор для измерения скорости потока воздуха: Термоанемометр ТКА-ПКМ (52), год выпуска март 2015, заводской номер 653. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.A № 38006. Свидетельство о поверке № 0001949 действительно до 16 января 2020 года.

Погрешность измерений соответствует погрешности применяемых методов измерений.

Замеры воздуха и испытания проводились в соответствии с нормативными документами:


- ГОСТ 12.3.018-79. «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний».
- СП 2.2.1.1312-03. «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА».

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:

Дата	Содержание	Подпись
23.12.2019	Производительность вентсистемы достаточна для эффективной вытяжки для лабораторных шкафов. Кратность воздухообмена соответствует требованиям п. 6.18 СП 2.2.1.1312-03 (Санитарно-эпидемиологические правила) и нормативу по расчетной скорости в периметре вытяжных зонтов при скорости вентилятора на 30-38 Гц. Испытания проводились на максимальной скорости частотного регулятора (кратковременный режим). *Замеры скорости воздуха в рабочем просвете Лабораторных шкафов, скорость воздуха у рабочих мест.	Инженер Макаров В.В.
	Кратность воздухообмена вентиляционной системы соответствует требованиям п. 6.18 СП 2.2.1.1312-03 (Санитарно-эпидемиологические правила), при этом максимальная скорость вентилятора на частоте 50Гц применяется в кратковременном режиме.	
	Скорость всасывания воздуха в большой вытяжной шкаф (номер мерного сечения 13) при открытой створке (рабочий просвет) 15 см составляет 0,9 м/сек.	
	Рекомендуется балансировка расходов воздуха по распределению на вытяжные зонты и шкафы (ручные воздушные клапаны имеются), по технологическому требованию. Рекомендуется монтаж в оконный проем или в стену — приточный воздушный клапан для компенсации вытяжного объема воздуха при работе вытяжной системы на максимальной частоте.	

Представитель проектной организации:	ООО «КК ВЕНТКОМПЛЕН	⟨C»	
	Генеральный Директор		Кулаков А.К.
		(подпись)	•
Представитель заказчика:			

дата: 23 декабря 2019 года.

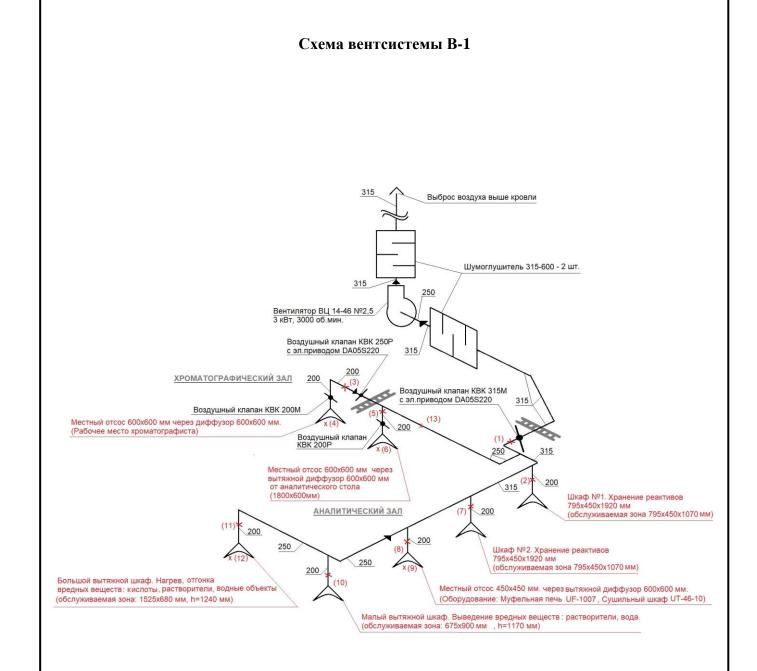

Инв. № подл Подпись и дата Взамен инв. №
